

Guayaquil, 23 de marzo de 2023

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

Contrato: No. L-CPG-3-2022-X-O


"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA GENERAL GOMEZ – LA CONDENCIA ENTRE LOS CANTONES DE SAMBORONDON Y DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS."

1.- INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO

ADMINISTRADOR:	Ing. Gabriel Orozco Cobeña
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing. Jonathan Barberán Flores de Valgas
FISCALIZACIÓN:	DIGECONTRUC SA Contrato No. S-CON-47-2022-X-0
SUPERVISOR DE LA FISCALIZACIÓN:	Ing. Rafael Tobar Morán
PROCESO:	LICO-GPG-DPOP-5-2021
CONTRATO:	L-CPG-3-2022-X-O
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de enero del 2022
PLAZO:	180 días
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL GUAYAS
MONTO:	USD \$ 4'221.407,94080
ANTICIPO:	SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO DE OBRA:	13 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	09 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 de octubre del 2022
CONTRATO COMPLEMENTARIO	USD \$ 283.714,55
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CC:	30 de diciembre del 2022
FECHA DE REINICIO:	04 de enero del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIÓN 1:	24 de marzo del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	03de febrero del 2023
STATUS:	SUSPENDIDA (INCIDENCIA DE LLUVIA)

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

VÍA	
Ancho de la capa de rodadura (Asfalto)	6.00 m
Ancho de Espaldones	1.50 m
Espesor de la carpeta asfáltica	3" = 7.50 cm
Espesor de Base Estabilizada con Asfalto	6" = 15.00 cm
Espesor de Base IP<6% CBR>80%	10" = 25.00 cm
Espesor de Sub-Base CBR>30%	12" = 30.00 cm
Espesor de Mejoramiento CBR>20%	12" = 30.00 cm

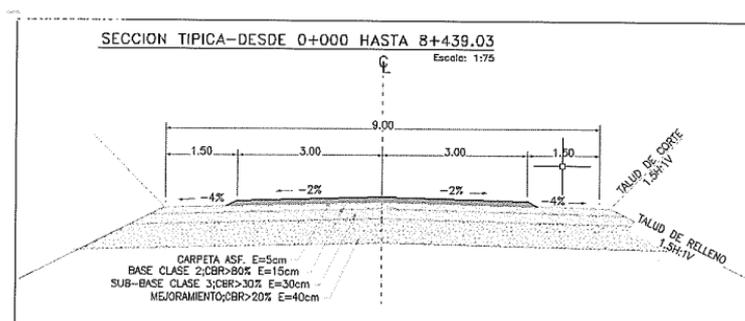

El proyecto tiene su inicio y fin entre las coordenadas UTM WGS 84 ZONA 17 que son:

COORDENADAS UTM WGS 84		
DESCRIPCIÓN	ESTE	NORTE
Inicio: Parroquia General Gómez (0+000)	632532.778	9779815.189
Final: Recinto La Condencia (8+326.91)	626058.604	9777225.705

4.- GENERALIDADES

El 26 de enero de 2022 se celebra el **CONTRATO NO. L-CPG-3-2022-X-O**, suscrito con el CONSORCIO VIAL GUAYAS, representado por el Sr Juan Diego Espinoza Pinos, en calidad de Procurador Común, cuyo objeto es "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA GENERAL GOMEZ – LA CONDENCIA ENTRE LOS CANTONES DE SAMBORONDON Y DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS."

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-2111-2022**, de fecha 09 de junio del 2022, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-3-2022-X-O, se dirige al Sr. Juan Diego Espinoza Pinos, Procurador Común de la época del **CONSORCIO VIAL GUAYAS**, para indicarle el inicio de las actividades a partir del **13 de junio del 2022**.

Mediante **Oficio DPOP-GAOC-3990-2022**, de fecha 21 de octubre del 2022, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato, se dirige al Sr. Juan Diego Espinoza Pinos, Procurador Común de la época del CONSORCIO VIAL GUAYAS; indicando la suspensión temporal de plazo, que rige desde el **21 de octubre del 2022**.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-0001-2023**, del 3 de enero del 2023, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato, se dirige al Sr. Juan Diego Espinoza Pinos, Procurador Común del CONSORCIO VIAL GUAYAS, indicando el **REINICIO DE LOS TRABAJOS** del contrato N° L-CPG-3-2022-X-O, a partir del **4 de enero del 2023**.

CONTRATO COMPLEMENTARIO

A los treinta (30) días del mes de diciembre del dos mil veintidós, la Prefectura del Guayas, con el CONSORCIO VIAL GUAYAS, **SUSCRIBEN** el **Contrato Complementario N°1** por el valor de **USD\$ 283.714,55** (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CON 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA

DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA

Al momento no existen cantidades de obra.

ORDEN DE TRABAJO

Al momento no existe orden de trabajo.

RESUMEN DE LAS PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA PRESENTADAS

N°	PERÍODO	MONTO	AVANCE ACUMULADO
PLANILLA 1	13/06/2022 - 12/07/2022	\$602.503,8638 14,27%	14,27%

PLANILLA 2	13/07/2022 – 11/08/2022	\$629.191,8297 14,90%	29,18%
PLANILLA 3	12/08/2022 – 10/09/2022	\$643.964,8736 15,25%	44,43%
PLANILLA 4	11/09/2022 – 10/10/2022	\$677.565,8872 16,05%	60,48%
PLANILLA 5	11/10/2022 – 20/10/2022 y 04/01/2023 – 23/01/2023	\$661.819,0057 15,68%	76,16%
TOTAL, PLANILLADO A LA FECHA		\$3.215.045,4600	(No incluye IVA)

PLANILLA ÚNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO	04/01/2023 – 02/02/2023	\$279.297,7667	98,44 %
--	----------------------------	----------------	---------

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-0759-2023**, de fecha 03 de febrero del 2023, el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Administrador del Contrato N° L-CPG-3-2022-X-O, se dirige a Sr. Juan Diego Espinoza Pinos, Procurador Común del CONSORCIO VIAL GUAYAS, acogiéndose a lo indicado en el **Oficio CSO-FISC-SB 036-2023**, concediendo **LA SUSPENSIÓN DE OBRA** de los trabajos del contrato N° L-CPG-3-2022-X-O.", esta **Rige a partir del 3 de febrero del 2023.**

REAJUSTES DE PRECIOS

N°	Tipo de Reajuste	MONTO
PLANILLA 1	Reajuste de Precios Provisional	\$ 25.305,16
PLANILLA 2	Reajuste de Precios Provisional	\$ 35.234,74
PLANILLA 3	Reajuste de Precios Provisional	\$ 36.062,03
PLANILLA 4	Reajuste de Precios Provisional	\$ 36.621,26

Los valores NO incluyen IVA.

CONCLUSIÓN

Por lo descrito en el memorando se da por informado el **STATUS** del Contrato **No. L-CPG-3-2022-X-O**, cuyo objeto es: REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA GENERAL GOMEZ – LA CONDENCIA ENTRE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS."

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes de ley.

Atentamente,

Ing. Jonathan Barberán
ANALISTA SENIOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
C.c. Archivo
