

Guayaquil, 24 de marzo de 2023  
**MEMORANDO DPOP-OCyC-MFN-2023-0028-M**

**Ingeniera**  
**Karin Lynnehe Franco Silva**  
**SUBDIRECTORA DE OBRAS POR CONTRATO Y CONTROL**

En su Despacho. –

**INFORME MENSUAL DE STATUS**

**Contrato:** No. L-CPG-18-2022-X-0

**Obra:** “REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SALITRE-SAMBORONDÓN DE LA LONGITUD 19KM, UBICADA EN LOS CANTONES SALITRE Y SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”

**Monto:** USD 11'497.938,55160


**Contratista:** CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE

**1.- OBJETO DEL CONTRATO**

“REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SALITRE-SAMBORONDÓN DE LA LONGITUD 19KM, UBICADA EN LOS CANTONES SALITRE Y SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.”

**2.- UBICACIÓN**

El proyecto se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, Cantones Samborondón y Salitre:

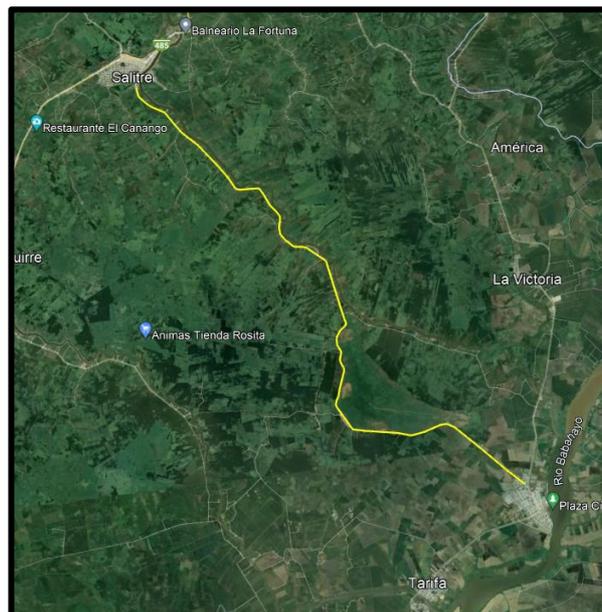


**COORDENADAS UTM WGS 84**

DESCRIPCIÓN	ESTE	NORTE
Inicio Samborondón	641.583,54	9'783.845,92
Fin Salitre	631.816,10	9'796.891,17

**2.1.- CARACTERISTICAS DE VÍA**  
**Sección Básica Tramo 1 (0+000 a 2+740)**

Ancho de la capa de rodadura (Asfalto)	10.70 m
Ancho de Espaldones	2.00 m
Ancho de berma	0.50 m
Ancho de Carril	3.35 m
Espesor de la carpeta asfáltica	4" = 10 cm
Espesor de Base clase 1A (MTO) (CBR> 80)	8" = 20.00 cm
Espesor de Sub-base clase 1 (MTO) (CBR> 40)	10" = 25.00 cm
Espesor de Material de mejoramiento con suelo seleccionado (CBR >20)	12" = 30.00 cm
Espesor de Material de filtro, compuesto por grava triturada sin finos (por efecto de ascensión capilar)	6" = 15.00 cm
<b>TOTAL ESPESORES</b>	<b>100 cm</b>

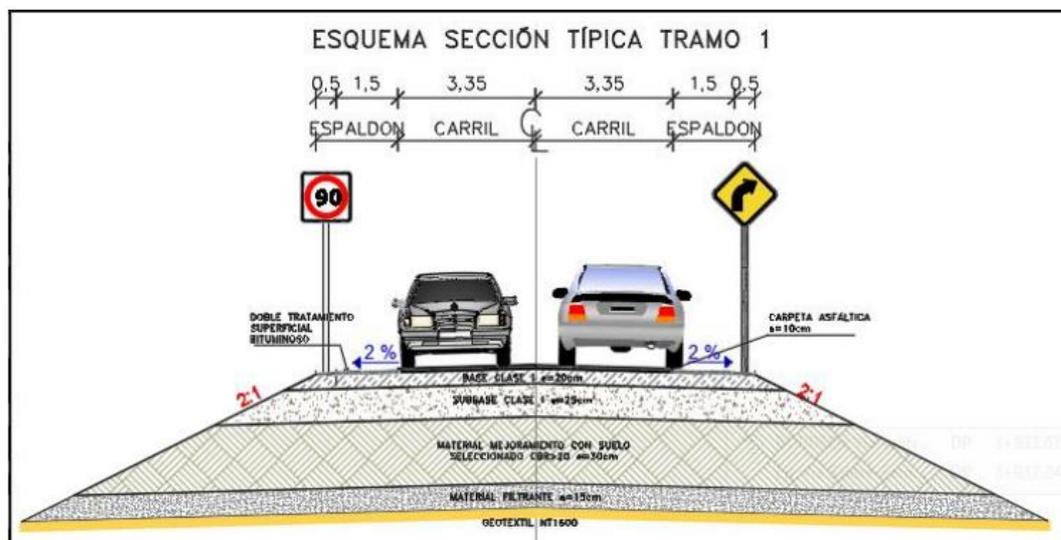

**Sección Básica Tramo 2 (2+740 a 9+260)**

Ancho de la capa de rodadura (Asfalto)	10.70 m
Ancho de Espaldones	2.00 m
Ancho de berma	0.50 m
Ancho de Carril	3.35 m
Espesor de la carpeta asfáltica	4" = 10 cm
Espesor de Base clase 1A (MTO) (CBR> 80)	8" = 20.00 cm
Espesor de Sub-base clase 1 (MTO) (CBR> 40)	10" = 25.00 cm
Espesor de Material de mejoramiento con suelo seleccionado (CBR >20)	18" = 45.00 cm
<b>TOTAL ESPESORES</b>	<b>100 cm</b>



**Sección Básica Tramo 3 (9+260 a 19+075)**

Ancho de la capa de rodadura (Asfalto)	10.70 m
Ancho de Espaldones	2.00 m
Ancho de berma	0.50 m
Ancho de Carril	3.35 m
Espesor de la carpeta asfáltica	4" = 10 cm
Espesor de Base clase 1A (MTO) (CBR> 80)	8" = 20.00 cm
Espesor de Sub-base clase 1 (MTO) (CBR> 40)	8" = 20.00 cm
Espesor de Material de mejoramiento con suelo seleccionado (CBR >20)	6" = 15.00 cm
Espesor de Material de filtro, compuesto por grava triturada sin finos (por efecto de ascensión capilar)	6" = 15.00 cm

**TOTAL ESPEORES**

**80 cm**



### 3.- INFORMACIÓN GENERAL

<b>ADMINISTRADOR:</b>	Ing. Gabriel Orozco Cobeña
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	Ing. María Fernanda Naranjo
<b>FISCALIZACIÓN:</b>	SOLUM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
<b>ADMINISTRADOR DE LA FISCALIZACIÓN:</b>	Ing. Julio Hernández
<b>PROCESO:</b>	LICO-PG-004-2022
<b>CONTRATO:</b>	L-CPG-18-2022-X-0
<b>PLAZO:</b>	360 días
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE
<b>MONTO:</b>	USD \$ 11'497.938,55160
<b>ANTICIPO 20% :</b>	USD \$ 2'299.587,71
<b>FECHA DE INICIO DE OBRA:</b>	06 de enero de 2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b>	31 de diciembre del 2023
<b>STATUS:</b>	SUSPENDIDO

### 4.- INICIO DEL CONTRATO

#### 4.1.- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO L-CPG-18-2022-X-0

El 23 de noviembre del 2022 se suscribió el **Contrato No. L-CPG-18-2022-X-0** entre el CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, representado por el Sr. Jimmy Xavier Vivar Cerezo en calidad de Procurador Común y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas cuyo objeto es **"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SALITRE-SAMBORONDÓN DE LA LONGITUD 19KM, UBICADA EN LOS CANTONES SALITRE Y SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"**.

##### 4.1.1.- DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO L-CPG-18-2022-X-0

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-4512-2022**, de fecha 30 de Noviembre de 2022, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-18-2022-X-0, designa a la **Ing. María Fernanda Naranjo Romo**, ANALISTA SENIOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, como **SUPERVISOR DEL CONTRATO** en mención.

#### 4.2.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE LA FISCALIZACIÓN No. S-CON-112-2022-X-0

El Gobierno Provincial del Guayas, de conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y artículos 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, con la finalidad de cumplir con los objetivos y necesidades de la Provincia, ha contemplado la **"FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SALITRE-SAMBORONDÓN DE LA LONGITUD 19KM, UBICADA EN LOS CANTONES SALITRE Y SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"**; ha celebrado el **CONTRATO No. S-CON-112-2022-X-0**, con **Solum Ingenieros Consultores S.A.**, legalmente representado por la Ing. Teresa de Jesús Armas Franco, en calidad de Gerente General, en la ciudad de Guayaquil el 09 de diciembre del 2022.

##### 4.2.1.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. S-CON-112-2022-X-0

Mediante **Oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2022-2498-OF**, de fecha 13 de diciembre de 2022, suscrito por el Ing. M.I. Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, indica que el **Ing. Julio Hernández Rodríguez**, ha sido designado como **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** en mención.

#### 4.3.- NOTIFICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE TÉCNICOS.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-4711-2022**, de fecha diciembre 14 del 2022, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-18-2022-X-0, se dirige al Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, para comunicarle los técnicos que van a intervenir en la Obra **“REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SALITRE-SAMBORONDÓN DE LA LONGITUD 19KM, UBICADA EN LOS CANTONES SALITRE Y SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.”**

#### 4.4.- NOTIFICACIÓN DE INFORME FAVORABLE, CUMPLIMIENTO DEL FORMULARIO 2.1

Mediante **Oficio N°007-SS-SOLUM-2023**, de fecha 04 de enero del 2023, suscrito por el Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización de Solum Ingenieros Consultores S.A., remite la aprobación de revisión de los parámetros de personal mínimo, experiencia del personal, equipo mínimo y metodología.

#### 4.5.- NOTIFICACIÓN DE INICIO DE TRABAJOS.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-0043-2023**, de fecha 05 enero de 2023 , suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-18-2022-X-0, se dirige al Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del **CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE**, para indicarle:

*(...)En mi calidad de Administrador de Contrato, notifico el **inicio de actividades** de la obra **“REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SALITRE-SAMBORONDÓN DE LA LONGITUD 19KM, UBICADA EN LOS CANTONES SALITRE Y SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”** a partir del **06 de enero de 2023**.(...)*

#### 4.6.- CRONOGRAMA #1.

Mediante **Oficio CSS-OF-017-202**, de fecha 01 de febrero del 2023, suscrito por el Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, realiza la entrega del Cronograma de Obra.

Mediante **Oficio No. 041-SS-SOLUM-2023** de fecha 01 de febrero del 2023, el Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., se dirige al Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Administrador del Contrato N° L-CPG-18-2022-X-0, luego del respectivo análisis, recomienda la Aprobación del Cronograma de obra solicitada por la contratista.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-0307-2023**, de fecha 07 de febrero de 2023, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-18-2022-X-0, se dirige al Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, indicando la **Aprobación** del Cronograma de Obra del Contrato No. L-CPG-18-2022-X-0.

### 5.- PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA PRESENTADAS

#### 5.1.- PLANILLA N° 1

Mediante **Oficio CSS-PL1-001-2023**, de fecha 09 de febrero del 2023, el Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, se dirige al Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., entregando la Planilla N°1 de Avance de Obra del periodo 06 de enero de 2023 al 04 de febrero de 2023.

Mediante **OFICIO N°055-SS-SOLUM-2023**, de fecha 14 de febrero del 2023, el Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., se dirige al Sr.

Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, realizando la primera devolución de la Planilla N°1 de Avance de Obra, para su respectiva corrección.

Mediante **Oficio CSS-PL1-002-2023, con fecha 17 de febrero** del 2023, el Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, se dirige al Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., realizando el primer reintegro la Planilla N°1 de Avance de Obra del periodo 06 de enero de 2023 al 04 de febrero de 2023.

Mediante **OFICIO N°058-SS-SOLUM-2023**, de fecha 17 de febrero del 2023, el Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., se dirige al Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, realizando la segunda devolución de la Planilla N°1 de Avance de Obra, para su respectiva corrección.

Mediante **Oficio CSS-PL1-003-2023**, con fecha 23 de febrero del 2023, el Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, se dirige al Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., realizando el segundo reintegro la Planilla N°1 de Avance de Obra del periodo 06 de enero de 2023 al 04 de febrero de 2023.

Mediante **OFICIO N°062-SS-SOLUM-2023**, de fecha 27 de febrero del 2023, el Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., se dirige al Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, realizando la tercera devolución de la Planilla N°1 de Avance de Obra, para su respectiva corrección.

Mediante **Oficio CSS-PL1-004-2023**, con fecha 28 de febrero del 2023, el Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, se dirige al Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., realizando el tercer reintegro la Planilla N°1 de Avance de Obra del periodo 06 de enero de 2023 al 04 de febrero de 2023.

Mediante **OFICIO N°063-SS-SOLUM-2023**, de fecha 02 de marzo del 2023, el Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., se dirige al Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, realizando la cuarta devolución de la Planilla N°1 de Avance de Obra, para su respectiva corrección.

Mediante **Oficio CSS-PL1-005-2023**, con fecha 06 de marzo del 2023, el Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, se dirige al Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., realizando el cuarto reintegro la Planilla N°1 de Avance de Obra del periodo 06 de enero de 2023 al 04 de febrero de 2023.

Mediante **OFICIO N°071-SS-SOLUM-2023**, de fecha 07 de marzo del 2023, el Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., se dirige al Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, realizando la quinta devolución de la Planilla N°1 de Avance de Obra, para su respectiva corrección.

Mediante **Oficio CSS-PL1-006-2023**, con fecha 11 de marzo del 2023, el Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, se dirige al Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., realizando el quinto reintegro la Planilla N°1 de Avance de Obra del periodo 06 de enero de 2023 al 04 de febrero de 2023.

Mediante **OFICIO N°076-SS-SOLUM-2023**, de fecha 16 de marzo del 2023, el Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., se dirige al Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, realizando la sexta devolución de la Planilla N°1 de Avance de Obra, para su respectiva corrección.

Mediante **Oficio CSS-PL1-007-2023**, con fecha 20 de marzo del 2023, el Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, se dirige al Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., realizando el sexto reingreso la Planilla N°1 de Avance de Obra del periodo 06 de enero de 2023 al 04 de febrero de 2023.

Mediante **OFICIO N°001-PL-SS-SOLUM-2023**, de fecha 22 de marzo del 2023, el Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., realiza la aprobación de la Planilla No. 1 de avance de obra.

#### 6.- SUSPENSION DE OBRA

Mediante **Oficio CSS-OF-039-2023**, con fecha 02 de marzo del 2023, el Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, se dirige al Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., solicitando la suspensión de la obra en referencia a partir del 24 de febrero de 2023.

Mediante **OFICIO N°070-SS-SOLUM-2023**, de fecha 03 de marzo del 2023, el Ing. Alejandro Velasco Filián, Director de Fiscalización del Solum Ingenieros Consultores S.A., se dirige al Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Administrador del Contrato N° L-CPG-18-2022-X-O, solicitando se autorice la suspensión de la obra en referencia.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-0650-2023**, de fecha 03 de marzo de 2023, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-18-2022-X-O, se dirige al Sr. Jimmy Vivar Cerezo, Procurador Común del CONSORCIO SAMBORONDÓN SALITRE, notificando la suspensión del plazo contractual a partir del 24 de febrero de 2023, hasta que mejoren las condiciones climáticas.

#### 7.- CONCLUSIÓN

De acuerdo a las recomendaciones establecidas por la Contraloría General del Estado, dentro del **Informe No. DPGY-0150-2021**, se emite el siguiente informe mensual de status del Contrato **No. L-CPG-18-2022-X-O**; el mismo que es para mantener el control permanente de la ejecución del contrato de esta manera se verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en los términos de referencia, de acuerdo a la metodología de trabajo, al personal técnico mínimo requerido, revisando que se ha emitido de manera oportuna y adecuada toda la documentación soporte para la ejecución del objeto del contrato.

Por lo descrito en el memorando se da por informado el **STATUS MENSUAL** del Contrato **No. L-CPG-18-2022-X-O**, cuyo objeto es: "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SALITRE-SAMBORONDÓN DE LA LONGITUD 19KM, UBICADA EN LOS CANTONES SALITRE Y SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS."

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes de ley.

Atentamente,

Ing. María Fernanda Naranjo R.  
**ANALISTA SENIOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS**  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO No. L-CPG-18-2022-X-O**  
C.c. Archivo
