

Ingeniera

Karin Franco Silva

**SUBDIRECTORA DE OBRAS POR CONTRATO Y CONTROL**

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS**

En su despacho. -

En cumplimiento a lo solicitado por usted en memorando DPOP-SD-OCyC-KFS-2023-0023-M del 16 de marzo de 2023, cumpla en informar el estado del Contrato **L-CPG-16-2022-X-0**, cuyo objeto es: **"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PLAYAS - ENGABAO DESDE LA ABCISA 8+260 HASTA LA ABCISA 12+512.98, EN EL CANTÓN PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"**

### 1. SUSCRIPCIÓN

El 17 de noviembre de 2022, el Gobierno Provincial del Guayas, suscribió con la compañía contratista ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S, la LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. L-CPG-16-2022-X-0, cuyo objeto es realizar los trabajos de "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PLAYAS - ENGABAO DESDE LA ABCISA 8+260 HASTA LA ABCISA 12+512.98, EN EL CANTÓN PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

### 2. INFORMACIÓN GENERAL

ADMINISTRADOR:	ING. JUAN XAVIER GALARZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	-
FISCALIZACIÓN CONTRATADA:	Ing. Olver Orlando Huayamabe Peña
ADMINISTRADOR DE LA FISCALIZACIÓN	ING. MELISA RIERA
PROCESO:	LICO-PG-007-2022
PLAZO:	180 DÍAS
CONTRATISTA:	ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S
MONTO:	USD \$ 3 611,989.49720
ANTICIPO 20%:	USD \$ 722,397.90
FECHA DE INICIO DE OBRA:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	27 DE JUNIO DE 2023
ESTADO ACTUAL:	EN EJECUCIÓN

### 3. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS CONTRATADAS

El proyecto se encuentra ubicado entre las poblaciones de General Villamil Playas y Engabao, estableciéndose en fases, las mismas que están conformadas de la siguiente manera:

**Fase I:** Le corresponde al mejoramiento de la vía actual y el sector a intervenir es desde las afueras de la población de Playas hasta llegar a Engabao cuyas coordenadas de inicio y fin se las observa en el siguiente cuadro. La longitud aproximada es de 11.32 km (ver Figura 1).

PUNTO	FASE	TRAMO	ABSCISA	COORDENADAS	
				ESTE	NORTE
INICIO	I	1	1+192.45	566,174.99	9,709,539.80
FIN			8+260.00	560,061.73	9,713,030.56
INICIO	I	2	8+260.00	560,061.73	9,713,030.56
FIN			12+512.98	557,011.77	9,715,621.15

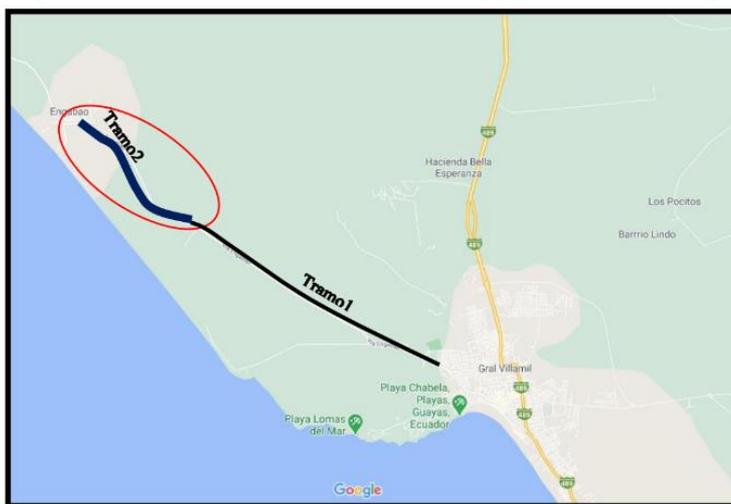



Figura 1. Ubicación del Proyecto  
Elaborado por: Equipo Técnico

TRAMO 1 Longitud de la vía: 4.25km

Espesor de Mejoramiento: 40cm

Espesor de Base: 18cm

Capa de Rodadura: 2"

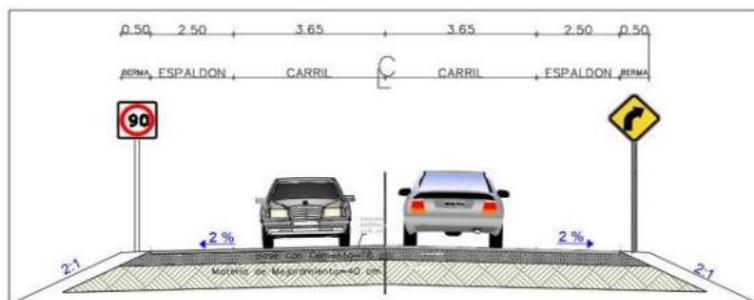

#### 4. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

##### 4.1 Inicio de Obra

Mediante oficio DPOP-JXG-0025-2022, de fecha 29 de diciembre de 2022, el Administrador de Contrato notifica la orden de inicio de los trabajos a partir del 30 de diciembre de 2022.

##### 4.2 Designación de Fiscalizador

Mediante oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2022-595-OF, suscrito el 1 de diciembre del 2022 por el Ing. M.I. Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, se pone a

conocimiento de esta Administración, la designación del Ing. Melisa Riera Parra, como Fiscalizadora Temporal del contrato No. L-CPG-16-2022-X-0.

Mediante oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2022-2497-OF, de fecha 13 de diciembre de 2022, suscrito por el Ing. M.I. Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, notifica que en virtud del contrato S-CON-113-2022-X-0 cuyo objeto es "FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PLAYAS – ENGABAO DESDE LA ABSCISA 8+260 HASTA LA ABSCISA 12+512.98, EN EL CANTÓN PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", el Ing. Olver Orlando Huayamabe Peña, será el FISCALIZADOR DEL CONTRATO No. L-CPG-16-2022-X-0.

## 5. ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

En virtud del Oficio No. DPOP-JXG-0035-2023, de fecha 27 de febrero del 2023 y el Oficio No. DPOP-JXGC-0054-2023, de fecha 06 de marzo del 2023, ambos suscritos por el Ing. Juan Galarza Cuadros, Administrador de contrato, y los oficios CONT S-CON-113-2022-X-0 OFIC-022, de fecha 27 de febrero del 2023; CONT S-CON-113-2022-X-0 OFIC-028, de fecha 03 de marzo del 2023, CONT S-CON-113-2022-X-0 OFIC-031, de fecha 06 de marzo del 2023, suscritos por el Ing. Olver Huayamave Pena, Director de Fiscalización Externa, quienes justifican la variación de las cantidades y autorizan la necesidad de suscribir la presente Acta de Diferencia en Cantidades de Obra, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; se deja constancia que en el Acta de Diferencia de Cantidades del Contrato No. L-CPG-16-2022-X-0, cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PLAYAS ENGABAO DESDE LA ABSCISA 8+260 HASTA LA ABSCISA 12+512,98, EN EL CANTÓN PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"., no se modifica el objeto del contrato principal.

El valor que la PREFECTURA DEL GUAYAS pagará a la CONTRATISTA por el Acta de Diferencia de Cantidades es de USD\$ 180,582.5262 (CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 5262/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA, que representa un 4,9995307666% del monto total contratado originalmente, de conformidad con los rubros aprobados por la Fiscalización externa, mediante CONT S-CON-113-2022-X-0 OFIC-022, de fecha 27 de febrero del 2023, detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE EN DOLARES		
						A EJECUTAR	EN MAS	EN MENOS	EJECUTADO	EN MAS	EN MENOS
<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>											
1	DESBRUCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha	12.7300	\$188.0100	\$2.118.2876	12.7600			2.118.2876		
2	EXCAVACION SIN CLASIFICACION	m3	11.784.8200	\$2.3200	\$29.047.7716	8.057.4455		- 3.727.3845	20.304.7627		- 9.393.0089
3	DESALDO DE MATERIAL DE EXCAVACION	m3	2.356.9600	\$0.2200	\$518.5312	8.057.4455	5.700.4855		1.772.6390	1.254.1048	
4	MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	18.337.0100	\$4.8100	\$78.981.0181	34.645.0000	18.327.9900		166.738.6500	88.157.6319	
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (CONVOLUTO DE ACARBO DE 8 - 10 km)	m3km	118.830.3400	\$0.2600	\$30.995.8834	294.632.5000	175.822.1600		76.609.6500	45.713.7616	
<b>CALZADA</b>											
6	CAPA DE RODADURA DE FORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA P-5 con 17% (Transporte)	m2	32.474.2000	\$7.9100	\$413.070.9220	52.748.8800	274.4800		417.242.0588	2.171.1368	
7	IMPRESACION ASPALTICA	m2	93.523.6800	\$1.1200	\$99.946.5216	53.757.0300	233.3500		60.207.8734	261.3520	
8	BASE DE AGREGADOS ESTABILIZADA CON CEMENTO (CONCRETO tipo masamental)	m3	0.7511.3000	\$78.0000	\$780.601.4000	9.845.9970	94.6970		767.987.7660	7.386.3660	
9	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON TUBO DE FLOCIONADO (RETELACION PRIMARIA INCLUIE)	m3	23.996.0400	\$7.8000	\$187.169.1120	24.644.0178	647.9778		192.323.3388	5.054.2268	
<b>PUENTE B-465 PRELIMINARES</b>											
10	DESBRUCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha	0.1200	\$188.0100	\$19.9212	0.1200			19.9212		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
11	EXCAVACION SIN CLASIFICACION	m3	6.889.2800	\$2.5200	\$16.856.9856	6.689.2800			16.856.9856		
12	DESALDO DE MATERIAL DE EXCAVACION	m3	6.889.2800	\$0.2200	\$1.471.6416	6.689.2800			1.471.6416		
13	MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	2.370.0000	\$4.8100	\$11.399.7000	2.370.0000			11.399.7000		
14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (CONVOLUTO DE ACARBO DE 8 - 10 km)	m3km	20.145.0000	\$0.2600	\$5.237.7000	20.145.0000			5.237.7000		
15	FORMON ESTRUCTURAL CLASE "A" (h = 350 mm, 1/3 M/20" INCLUSION ESTIBO Y 60/60 DE ALA Y ACCESO DE REFUERZO EN BARRAS, FLUENCIA FF = 4200 kg/cm2)	m3	772.1500	\$285.1200	\$204.712.4000	749.7900		- 22.3600	198.784.3248		- 5.928.0832
16	FORMON NO ESTRUCTURAL CLASE "B" (h = 180 kg/cm2) (INC. ENCLAVADOS)	m3	36.4600	\$162.2200	\$5.914.5412	36.4600			5.914.5412		
17	PILOTE PREARMADO D = 800 mm h = 350 kg/cm2	m	450.0000	\$674.0000	\$303.322.5000	450.0000			303.322.5000		
18	PILOTE PREARMADO D = 800 mm h = 350 kg/cm2	m	450.0000	\$444.3700	\$200.066.5000	450.0000			200.066.5000		
19	PILOTE PREARMADO D = 800 mm h = 350 kg/cm2	m	450.0000	\$444.3700	\$200.066.5000	450.0000			200.066.5000		
20	PIEDRA TIRADIZA (SUB DREN) (Inc. Transporte)	m3	86.0000	\$28.0200	\$2.409.7200	86.0000			2.409.7200		
21	GEOTEXTIL 1600NT	m2	603.2000	\$1.8200	\$1.158.1440	603.2000			1.158.1440		
22	TUBOS PVC 4" (DRENES)	m	67.5000	\$4.5800	\$309.1500	67.5000			309.1500		
<b>SUPERESTRUCTURA</b>											
23	PLACAS DE NEOPRENO 140x140x5 cm)	u	14.0000	\$344.0700	\$4.814.9800	14.0000			4.814.9800		
24	PLACAS DE NEOPRENO 130x130x2 cm)	u	14.0000	\$83.5200	\$889.2800	4.0000		- 10.0000	254.0800		- 635.2000
25	SUMINISTRO DE VIDAS TIPO CALIFORNIA H-1 20 M L-21 18 (Inc. Transporte)	u	7.0000	\$13.647.2000	\$95.530.4000	7.0000			95.530.4000		
26	MONTAJE DE VIDAS TIPO CALIFORNIA H-1 20 M L-21 18 (Inc. Transporte)	u	7.0000	\$2.005.7000	\$14.040.0000	7.0000			14.040.0000		
27	ACCESO DE REFUERZO EN BARRAS, FLUENCIA FF = 4200 kg/cm2	Kg	9.450.2800	\$2.3500	\$22.206.1500	11.708.3750	2.258.0950		27.514.6813	5.306.5232	
28	FORMON ESTRUCTURAL CLASE "A" (h = 280 kg/cm2) (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCLAVADOS)	m3	113.4000	\$237.0200	\$26.878.0800	99.0100		- 14.3900	23.467.3502		- 3.410.7178
29	JUNTA DE DILATACION TIPO TRANSFLEX 200, DUREZA (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCLAVADOS)	m	28.0000	\$272.7300	\$7.636.4400	28.0000			7.636.4400		
30	FORMON DE FUNDACION (p 30 MM A325) INC. BARRAS Y ANILLOS	u	12.0000	\$141.9600	\$1.703.5200	12.0000			1.703.5200		
31	TUBOS PVC 4" (DRENES)	m	16.8000	\$4.5800	\$76.9440	16.8000			76.9440		
32	CAPA DE RODADURA DE FORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA P-5 con 17% (Transporte)	m2	301.7500	\$7.9100	\$2.386.8425	301.7500			2.386.8425		
33	IMPRESACION ASPALTICA	m2	301.7500	\$1.1200	\$337.9600	301.7500			337.9600		
34	NEUMOS TIPO JETSEY	m	58.4000	\$106.2400	\$6.204.4160	58.4000			6.204.4160		
<b>APROCHES</b>											
35	MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	185.3300	\$4.8100	\$891.4373	185.3300			891.4373		
36	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (CONVOLUTO DE ACARBO DE 8 - 10 km)	m3km	1.575.3000	\$0.2600	\$409.5780	1.575.3000			409.5780		
37	FORMON ESTRUCTURAL CLASE "A" (h = 280 kg/cm2) (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCLAVADOS)	m3	38.6100	\$237.0200	\$9.151.9422	38.6100			9.151.9422		
38	ACCESO DE REFUERZO EN BARRAS, FLUENCIA FF = 4200 kg/cm2	Kg	5.936.7300	\$2.3500	\$13.951.3155	6.090.1216	153.3916		14.311.7858	360.4793	
<b>PROTECCION DE CAUCE</b>											
39	GEOTEXTIL 1600NT	m2	1.617.0000	\$1.4400	\$2.328.4800	1.772.3380	155.3380		2.904.6671	254.7871	
40	ENDICADO (PIEDRA 10CM + DM + 30CM)	m3	970.2000	\$22.9400	\$22.256.3800	985.0138	14.8138		22.594.2166	339.8386	
<b>SENALETICA VERTICAL</b>											
41	SENALES AL LADO DE LA CARRETERA (900 X 900MM)	u	30.0000	\$288.1800	\$8.644.8000	30.0000			8.644.8000		
42	SENALES AL LADO DE LA CARRETERA (900 X 300MM)	u	14.0000	\$201.8400	\$2.825.7600	14.0000			2.825.7600		
43	SENALES AL LADO DE LA CARRETERA (430 X 600MM)	u	11.0000	\$201.8400	\$2.242.2400	11.0000			2.242.2400		
44	SENALES AL LADO DE LA CARRETERA (750 X 750MM)	u	3.0000	\$249.8700	\$749.6100	3.0000			749.6100		
45	SENALES AL LADO DE LA CARRETERA (900 X 750MM)	u	32.0000	\$266.4200	\$8.531.4400	32.0000			8.531.4400		
46	SENALES AL LADO DE LA CARRETERA (1100 X 900MM)	u	2.0000	\$377.1400	\$754.2800	2.0000			754.2800		
47	SENALES AL LADO DE LA CARRETERA (1500 X 1200MM)	u	6.0000	\$344.1700	\$2.065.0200	6.0000			2.065.0200		
48	SENALES AL LADO DE LA CARRETERA (1220 X 600MM)	u	1.0000	\$307.7500	\$307.7500	1.0000			307.7500		

HORIZONTAL								
49	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA SEGMENTADA SEPARADORA DE CALLES 120 CM	m	2,642.0000	\$15.400	\$40.688.0000	2,642.0000		4,068.6800
50	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONTINUA DE PISO DE CALZADA 120 CM	m	8,306.0000	\$1.5400	\$12.791.2000	8,506.0000		13,249.3400
51	CONSTRUCCIÓN DE TACHAS COLOR DIRECCIONAL BLANCO	u	750.0000	\$4.9000	\$3.675.0000	750.0000		3,714.2000
52	CONSTRUCCIÓN DE TACHAS COLOR DIRECCIONAL AMARILLO	u	379.0000	\$4.9000	\$1.857.1000	379.0000		1,857.1000
53	MARCAS DE PAVIMENTO, MARCAS SOBRE LA CALZADA PUEBLAS DE DIRECCION (Botones "Microondas") TACHAS	m2	100.2000	\$6.2000	\$621.2400	100.2000		621.2400
54	SEÑALIZACION DOBLE	m	100.0000	\$105.8800	\$10.588.0000	100.0000		10,588.0000
SEGURIDAD VIAL								
55	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (750 X 750MM)	u	24.0000	\$249.8700	\$5.996.8800	24.0000		5,996.8800
56	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (2000 X 600)	u	3.0000	\$324.5000	\$1.573.5000	3.0000		1,573.5000
57	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (1200 X 400MM)	u	5.0000	\$305.9000	\$1.529.5000	5.0000		1,529.5000
58	SEÑALIZACION PREVENTIVA TEMPORAL (1200 X 900MM)	u	5.0000	\$157.8000	\$789.0000	5.0000		789.0000
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
59	CONOS TAMBORES (TANQUETAS DE PVC DE 90CM)	u	30.0000	\$90.8000	\$2.724.0000	30.0000		2,724.0000
60	PARANTES VIALES DE PVC (CUNEROS DE TRAFICO 70-80 CM)	u	170.0000	\$40.2700	\$6.845.9000	170.0000		6,845.9000
61	MALLA PLASTICA 1 M DE ANCHO	m	1,030.0000	\$2.9400	\$3.019.2000	1,030.0000		3,079.2000
62	BARREAS SIMPES 800 X 100 CM	u	3.0000	\$47.2500	\$141.7500	3.0000		141.7500
ALCANTARILLAS								
63	REMOCION DE HORMIGON (ESTRUCTURAS MENORES)	m3	2.5000	\$40.0000	\$100.0000	2.5000		100.0000
64	REMOCION DE TUBERIA H.A.	m	38.2400	\$48.0000	\$1.833.6000	38.2400		2,481.0112
65	TUBERIA H. A. 60 PULGADAS	m	23.0000	\$1.180.6300	\$27.154.9000	23.0000		27,154.9000
66	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	2,395.6000	\$10.0700	\$24.076.2000	2,395.6000		24,076.2000
67	HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "A" (P=280 kg/cm2) (SIC. INCREMENTO DE CEMENTO Y PLASTIFICADOR)	m3	303.8000	\$237.0200	\$72.006.6760	223.4500	- 80.3500	52,962.1190
68	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS. FLEMECIA PY = 4200 kg/cm2	kg	10,022.1400	\$4.5000	\$45.100.2300	19,361.2368	9,339.0968	45,498.9065
69	JUNTAS IMPERMEABLES DE PVC 10 CM	m	39.0000	\$9.6100	\$374.7900	39.0000		374.7900
70	ENCUADRO (PIEDRA 10CM + CIM + 30CM)	m3	15.0000	\$22.9400	\$344.1000	58.7148	43.7148	1,346.9175
71	HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "C" (P=180 kg/cm2) (SIC. FLEMECIA)	m3	21.4000	\$162.2200	\$3.471.3000	21.4000		3,471.3000
72	MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	1,959.1200	\$4.8100	\$9.423.3672	1,959.1200		9,423.3672
73	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO. LONGITUD DE CAMINO DE 8 - 10km	m3-km	16,652.4800	\$0.2800	\$4.661.8720	16,652.4800		4,661.8720
ELECTRICO								
VIALES/VENTILADORES								
74	POSTE METALICO CIRCULAR 12M	u	214.0000	\$730.8100	\$156.393.3400	214.0000		156,393.3400
75	LUMINARIA SOLAR TIPO LED 100WATT 220V EFICIENCIA 90% PARA VIA 300 DEL. SIC. LUMINARIA	u	214.0000	\$2.237.2900	\$478.780.0600	214.0000		478,780.0600
AMBIENTAL								
76	ESCOMBRAS ( DISPOSICION FINAL Y TISAMENTO PAISAJISTICO DE ZONAS DE DEPOSITO )	m3	3,192.8000	\$0.3100	\$989.7600	8,057.4455	4,864.6455	2,497.8061
77	AGUA PARA EL CONTROL DEL POLVO	m3	9,111.9900	\$1.6100	\$14.679.3039	5,111.9900		14,679.3039
78	BATERIA SANITARIA PORTATIL	u	12.0000	\$185.8300	\$2,229.9600	12.0000		2,229.9600
79	PLANTAS DE ACORDE (ARBOLITOS INCL. PLANTACION, RIEGO Y MANTENIMIENTO ENCL. )	u	670.0000	\$24.5400	\$16,441.8000	670.0000		16,441.8000
80	MATERIAL PAPELADO (ESTACION DE MEDICIONES DE SONIDO)	u	4.0000	\$198.4300	\$793.7200	4.0000		793.7200
81	PLAN DE MANTENIMIENTO ASISTENCIAL DE RESERVOIRIOS (SISTEMAS Y TANQUES METALICOS CON TAPA)	u	12.0000	\$17.5000	\$210.0000	12.0000		210.0000
82	MONITOREO DE RUIDO	u	4.0000	\$55.8100	\$223.2400	4.0000		223.2400
83	SEÑALIZACION PREVENTIVA	u	10.0000	\$244.8000	\$2.448.0000	10.0000		2,448.0000
84	REUNION INFORMATIVA CON LA COMUNIDAD	u	2.0000	\$421.2000	\$842.4000	2.0000		842.4000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,611,989.4972</b>		<b>3,792,572.0234</b>
								<b>218,594.0932</b>
								<b>- 38,411.57</b>

El 14 de marzo de 2023, se suscribe el ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA, promovida por el contratista y aprobada por la fiscalización y administración del contrato.

## 6. CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

Con los antecedentes expuestos, en virtud del Oficio No. DPOP-JXG-0041-2023, de fecha 01 de marzo del 2023, y el Oficio No. DPOP-JXGC-0057-2023, de fecha 07 de marzo del 2023, ambos suscritos por el Ing. Juan Galarza Cuadros, Administrador de contrato, y los Oficios CONT S-CON-113-2022-X-0 OFIC-024, de fecha 28 de febrero del 2023 y CONT S-CON-113-2022-X-0 OFIC-034a, de fecha 07 de marzo del 2023, ambos suscritos por el Ing. Olver Huayamave Pena, Director de Fiscalización Externa, quienes justifican el aumento de cantidades y autorizan la necesidad de suscribir el presente contrato complementario, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; se deja constancia que en el Contrato Complementario del Contrato No. L-CPG-16-2022-X-0, cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PLAYAS ENGABAO DESDE LA ABSCISA 8+260 HASTA LA ABSCISA 12+512,98, EN EL CANTÓN PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", no se modifica el objeto del contrato principal.

El valor que la PREFECTURA DEL GUAYAS pagará a la CONTRATISTA por el Contrato Complementario es de USD\$ 176,801.3739 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UNO CON 3739/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA, que representa un 4,8948473975% del monto total contratado originalmente, de conformidad con

los rubros aprobados por la Fiscalización externa, mediante S-CON-113-2022-X-0 OFIC-024, de fecha 28 de febrero del 2023, detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO	TOTAL
<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>						
1	MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	25.185,3809	\$4,8100	\$121.141,6821	
2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 8 - 10 km	m3-km	214.075,7377	\$0,2600	\$55.659,6918	
					<b>TOTAL:</b>	<b>176.801,3739</b>
						<b>4,8948473975%</b>

El 15 de marzo de 2023, se suscribe el CONTRATO COMPLEMENTARIO 1, promovida por el contratista y aprobada por la fiscalización y administración del contrato.

## 7. CONTRATO COMPLEMENTARIO 2

Con los antecedentes expuestos, en virtud del Oficio No. DPOP-JXG-0042-2023, de fecha 01 de marzo del 2023 y el Oficio No. DPOP-JXG-0058-2023, de fecha 06 de marzo del 2023, ambos suscritos por el Ing. Juan Galarza Cuadros, Administrador de contrato, y el oficio CONT S-CON-113-2022-X-0 OFIC-025, de fecha 28 de febrero del 2023, suscrito por el Ing. Olver Huayamave Pena, Director de Fiscalización Externa, quienes justifican la creación de rubros nuevos y autorizan la necesidad de suscribir el presente contrato complementario, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; se deja constancia que en el Contrato Complementario del Contrato No. L-CPG-16-2022-X-0, cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PLAYAS ENGABAO DESDE LA ABSCISA 8+260 HASTA LA ABSCISA 12+512,98, EN EL CANTÓN PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", no se modifica el objeto del contrato principal.

El valor que la PREFECTURA DEL GUAYAS pagará a la CONTRATISTA por el Contrato Complementario es de USD\$ 109,984.3460 (CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 3460/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA, que representa un 3,04497967% del monto total contratado originalmente, de conformidad con los rubros aprobados por la Fiscalización externa, mediante CONT S-CON-113-2022-X-0 OFIC-025, de fecha 28 de febrero del 2023, detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO	TOTAL
<b>RUBROS NUEVOS</b>						
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA H.A. 48"	m	127,7000	\$723,6800	\$92.413,9360	
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PCV 875mm (DI=800MM), DOBLE PARED ESTRUCTURADA	m	63,0000	\$271,3500	\$17.095,0500	
5	PLACAS DE NEOPRENO (55x12x2 cm)	u	8,0000	\$59,4200	\$475,3600	
					<b>TOTAL:</b>	<b>109.984,3460</b>
						<b>3,0449796735%</b>

El 15 de marzo de 2023, se suscribe el CONTRATO COMPLEMENTARIO 2, promovida por el contratista y aprobada por la fiscalización y administración del contrato.

## 8. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

### 8.1 Resumen de Pago de Planillas

N°	MONTO	ESTADO
PLANILLA 1	-	TRAMITE EN FINANCIERO
PLANILLA 2	-	TRAMITE EN FINANCIERO

### 8.2 Reajustes

N°	MONTO	ESTADO
REAJUSTE DEFINITIVO DE ANTICIPO	-	TRAMITE EN OBRAS PÚBLICAS
REAJUSTE DE PRECIO PROVISIONAL PLANILLA1	-	TRAMITE EN OBRAS PÚBLICAS

## 9. CONCLUSIÓN

El contrato L-CPG-16-2022-X-0 se encuentra en ejecución, con un porcentaje de avance del 15 %, presenta prorrogas por 60 días, por motivos de los contratos complementarios y acta de diferencia de cantidades, no hay suspensiones hasta la presente fecha.

Particular que informo, en cumplimiento de lo solicitado.

Atentamente,

Ing. Juan Xavier Galarza Cuadros  
**Supervisor de Contrato**
